REPÚBLICA DE PANAMÁ
GOBIERNO NACIONAL
MINISTERIO DE CULTURA

BICENTENARIO
Independencia de Panamá de España
1821 - 2021

Informe de Ejecución Presupuestaria
Funcionamiento e Inversiones

Del período 1 de enero 2021 al 28 de febrero 2021

LOS DERECHOS CULTURALES, SON DERECHOS HUMANOS

CARLOS AGUILAR NAVARRO
Ministro

GABRIEL GONZÁLEZ
Viceministro

JOSE ISMAEL HERRERA
Secretario General

FLOR DEL LOTTO CONCEPCIÓN
Directora de Administración y Finanzas

Departamento de Presupuesto

Mayanin George	Supervisora
Inés Gordon	Analista
Ivanova Maruri	Analista
Belkis López	Analista
Sheila Bosso	Analista
Viviana Villarreal	Secretaria

INTRODUCCIÓN

Cumpliendo con las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenida en la Ley No. 176 del 13 de noviembre de 2020, “Que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia Fiscal 2021”, presenta mediante este documento el “INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA” del Ministerio de Cultura, correspondiente al período comprendido del **1 de enero 2021 al 28 de febrero de 2021.**

La Gestión presupuestaria tiene como finalidad la administración de los recursos asignados, sobre la base de los ordenamientos: jurídicos, técnicos y administrativos que determina la Ley, a fin de promover la transparencia, eficiencia del uso de los mismos. Es por esto que, este informe contempla los recursos presupuestarios aprobados al Ministerio de Cultura, entidad que desarrolla las políticas culturales y ejecuta las actividades destinadas a difundir y estimular la cultura en el territorio nacional. Nuestro presupuesto y su ejecución considera la misión y visión del Ministerio de Cultura, y estos a su vez en los objetivos específicos, proyecciones, estrategias y políticas del Ministerio.

Para llevar a cabo los programas y proyectos, al ministerio se le autorizó un Presupuesto Ley de B/.45,504,521.00; para la vigencia fiscal 2021.

Finalmente, en los anexos se localizan cuadros que recogen una serie de informaciones relacionadas al presupuesto, su seguimiento y ejecución.

Esperamos que este informe sea de gran utilidad, tanto a las Autoridades, como a las diferentes unidades administrativas y entidades públicas que requieren de esta información para la toma de decisiones.

MISIÓN

Ser la entidad rectora del Estado en materia de promoción y protección de los derechos culturales; las expresiones culturales; los procesos creativos y el patrimonio cultural e histórico; el diálogo intercultural y la cooperación cultural; así como de todas las actividades relacionadas con el fomento del desarrollo sostenible a través de la cultura y las políticas públicas de cultura en el territorio nacional, para permitir y facilitar el acceso a ello, a la ciudadanía en general.

VISIÓN

Ser la entidad del Estado, modelo y líder en la gestión administrativa y operativa, en el respeto por la diversidad de expresiones culturales, facilitando los mecanismos del diálogo y la integración, que permitan el cumplimiento del desarrollo sostenible de las políticas culturales en la sociedad panameña; y en los temas de cumplimiento de normas anti soborno, equidad, transparencia e inclusión

OBJETIVOS

1. Generar políticas públicas que permitan el desarrollo cultural del país, basándose en los ejes transversales siguientes: derechos culturales y ciudadanía, expresiones artísticas, educación artística, economía creativa, y mantenimiento y salvaguarda del patrimonio cultural.

2. Fortalecer la presencia de las expresiones culturales panameñas ante los organismos nacionales e internacionales, en los temas relacionados con la diversidad cultural.

3. Facilitar el diálogo e intercambio de las diversas expresiones culturales, a nivel nacional e internacional.

4. Garantizar a toda la ciudadanía el acceso, inclusión y disfrute, de las actividades, bienes y servicios culturales.

5. Promover la cultura como un generador del desarrollo sostenible, mediante políticas públicas enfocadas en los derechos ciudadanos y en la economía creativa que busquen la cohesión social en el país y permitan combatir la desigualdad y la pobreza.

6. Generar planes estratégicos y herramientas de medición que permitan evaluar el impacto en la economía del país, de las diversas actividades y expresiones culturales de la ciudadanía.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....3
MISIÓN.....4
VISIÓN.....4
OBJETIVOS.....5
CONTENIDO.....6
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS.....7
I. MARCO GENERAL.....8
II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES.....9
III. Presupuesto de Funcionamiento.....9
A - Servicios Personales.....10
B - Servicios No Personales 10
C - Materiales y Suministros.....10
D - Transferencias Corrientes 11
IV. PRESUPUESTO DE INVERSIONES.....12
Programa de Mantenimiento y Reparación de Obras.....12
A- Monumentos y Conjuntos Monumentales.....12
B- Centros Culturales.....13
C- Centros de Educación Artística.....14
D- Museos e Iglesias 14
E- Proyectos Regionales-Culturales 14
Programa de Apoyo a la conservación del Patrimonio Cultural y Natural, Préstamo BID N°4450/OC-PN: 15
ANEXOS
Detalles por Grupos de Gastos de la Ejecución de Funcionamiento.
Detalle de la Ejecución de las Inversiones.

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

Para el cumplimiento de los objetivos del Ministerio, presentamos la estructura del Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado y modificado para la vigencia fiscal 2021.

Cuadro 1

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS		
DETALLE	**LEY**	**MODIFICADO**
INGRESOS		
Ingresos Corrientes	25,420,521	25,420,521
Fondo de autogestión	238,300	238,300
Ingresos de Capital	14,605,700	14,605,700
Prestamos -BID	5,240,000	5,240,000
Total de Ingresos	**45,504,521**	**45,504,521**
GASTOS		
Funcionamiento	25,420,521	25,420,521
Fondo de autogestión	238,300	238,300
Total Presupuestario de Funcionamiento	**25,658,821**	**25,658,821**
Inversiones	14,605,700	14,605,700
Organismo Interamericano de Financiamiento BID 4450/OC-PN	5,240,000	5,240,000
Total Presupuestario de Inversiones	**19,845,700**	**19,845,700**
Total de Gastos	**45,504,521**	**45,504,521**

I. MARCO GENERAL

Al Ministerio de Cultura, creado mediante la Ley N°. 90 del 15 de agosto de 2019, se le aprueba mediante la Ley N°. 176 del 13 de noviembre de 2020 el presupuesto Ley para la vigencia fiscal 2021, por la suma de **Cuarenta y Cinco Millones Quinientos Cuatro Mil Quinientos Veintiuno Balboas** (B/.45,504,521). correspondiéndole a **Funcionamiento el 56.4% (**B/.25,658,821), y a las **Inversiones el 43.6%** (B/.19,845,700) Cuadro 2.

Cuadro 2

TIPO DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	
	LEY	MODIFICADO	%
TOTAL	**45,504,521**	**45,504,521**	**100**
FUNCIONAMIENTO	25,658,821	25,658,821	56.4
INVERSIÓN	19,845,700	19,845,700	43.6

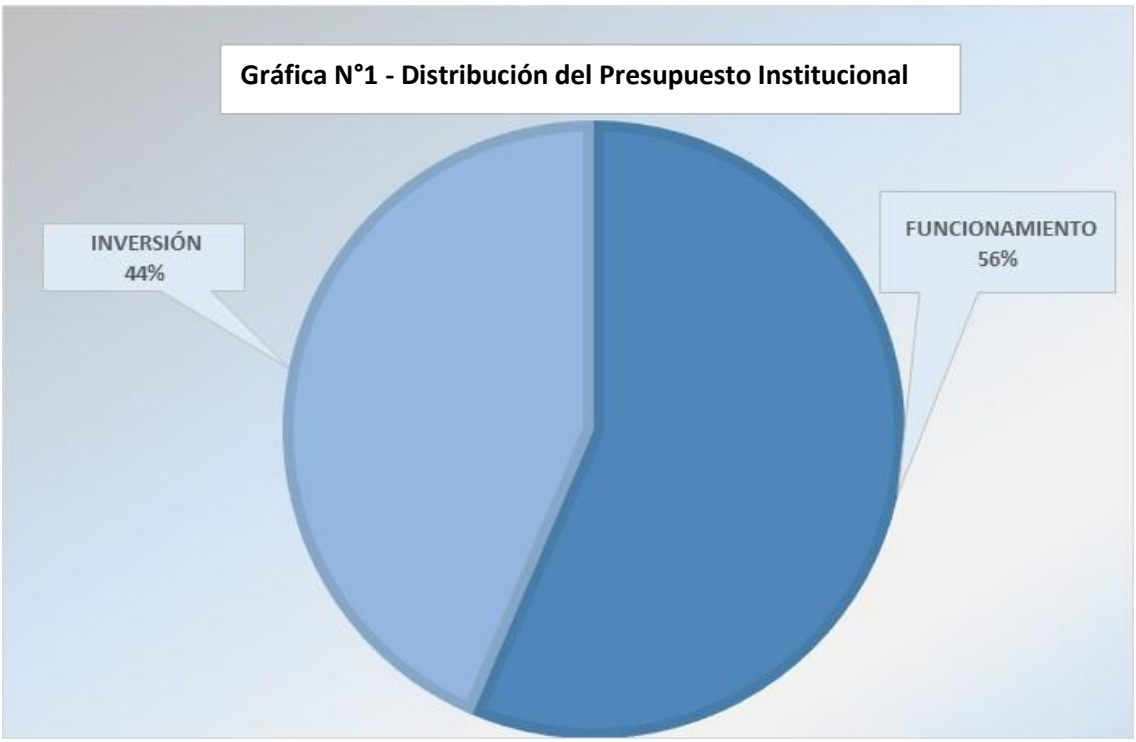

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES

Al mes de febrero nuestro Presupuesto modificado es de **Cuarenta y Cinco Millones Quinientos Cuatro Mil Quinientos Veintiuno Balboas** (B/.45,504,521).

El análisis que presentamos de la ejecución presupuestaria al mes de febrero, está basado en el presupuesto asignado que es del **40%** (B/.18,208,928); de los cuales se comprometió el **60%** (B/.10,866,733), la ejecución[1] está por el orden del **31%** (B/.5,683,756), de los cuales se pagó el **39% (**B/.2,224,826). Cuadro 3

cuadro 3

Detalle	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN			% de EJECUCIÓN		
	Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	Devengado	Pagado	Comprometido	Devengado	Pagado
	1	2	3	4	5	6	7=4/3*100	8=5/3*100	9=6/5*100
TOTAL INSTITUCIONAL	**45,504,521**	**45,504,521**	**18,208,928**	**10,866,734**	**5,683,756**	**2,224,826**	**60**	**31**	**39**
FUNCIONAMIENTO	**25,658,821**	**25,658,821**	**9,306,151**	**6,532,301**	**5,433,809**	**2,201,679**	**70**	**58**	**41**
INVERSIÓN	**19,845,700**	**19,845,700**	**8,902,777**	**4,334,433**	**249,947**	**23,147**	**49**	**3**	**9**
Mantenimiento y Reparaciones de obras	14,605,700	14,605,700	4,120,478	2,222,233	249,947	23,147	54	6	1
Centro Gestor del Préstamo BID 4450/OC-PN	5,240,000	5,240,000	4,782,299	2,112,200	-	-	44	0	0

III. Presupuesto de Funcionamiento: Presupuesto Ley B/.25,658,821.

Al mes de febrero el presupuesto para los gastos operativos era de **B/.25,658,821;** distribuidos entre los siguientes grupos de gastos: el **72%** (B/.18,454,366) Servicios Personales, el **11%** (B/.2,725,603) Servicios No Personales, **1%** (B/.396,306) Materiales y Suministros, **0%** (B/.100) Maquinaria, Equipo y Semoviente, **16%** (B/.4,054,627) Transferencias Corrientes. El compromiso está por el orden del **70%** (B/.6,532,301), la ejecución fue del**58**% (B/.5,433,809) de los cuales se ha pagado el **41%** (B/2,201,679)

Cuadro 4

Detalle	Presupuesto			Comprometido	Devengado	Pagado	% Ejecutado			Saldo Anual
	Ley	Modificado	Asignado				Comprometido	Devengado	Pagado	
	1	2	3	4	5	6	7 = 4/3*100	8=5/3*100	9=6/5*100	10=2-4
TOTAL	**25,658,821**	**25,658,821**	**9,306,151**	**6,532,301**	**5,433,809**	**2,201,679**	**70**	**58**	**41**	**19,126,520**
Servicios Personales	18,454,366	18,454,366	3,350,227	2,331,975	2,331,975	2,145,553	70	70	92	16,122,391
Servicios No Personales	2,725,603	2,753,422	1,627,556	1,129,636	100,931	56,126	69	6	56	1,623,786
Materiales y Suministros	279,221	396,306	273,641	70,689	903	-	26	0	0	325,617
Maquinaria y Equipo	-	100	100	-	-	-	0	0	0	100
Transferencias Corrientes	4,199,631	4,054,627	4,054,627	3,000,000	3,000,000	-	74	74	0	1,054,627

[1] Ejecución, se refiere al devengado.

A - Servicios Personales:

Presupuesto Modificado: B/.18,454,366, de esta suma se ha asignado el **18%** (B/.3,350,227).

En este grupo de gasto se ejecutan las acciones de administración del personal, sus rubros reflejan: Sueldo Fijo, Honorarios, Décimo Tercer Mes, Cuotas Obreros Patronales, Gastos de Representación, entre otros.

Del monto asignado, se comprometio el **70%** (B/.2,331,975), la ejecución fue del **70%** (B/. B/.2,331,975) de los cuales se pagó el 92% (B/.2,145,553).

B - Servicios No Personales:

Presupuesto Modificado es de B/.2,753,422, se asignó el **59%** (B/.1,627,556.)

Los compromisos realizados corresponden a la prestación de servicios de carácter no personal al igual que la utilización de bienes muebles e inmuebles, e incluye servicios básicos (luz, agua, teléfonos y otros).

El compromiso fue del **69%** (B/.1,129,636), la ejecución fue del **6%** (B/. B/.100,931) y el pagado del 56% (B/.56,126).

C - Materiales y Suministros:

Presupuesto Modificado es de B/.396,306, la asignación fue del 26% (B/.273,641).

Estos recursos van destinado a la adquisición de materiales en general para el desarrollo de las acciones administrativas necesarias en el cumplimiento de metas y objetivos, tanto de operaciones propias del Ministerio, como de los programas y proyectos de inversión que se ejecutan.

El compromiso fue del **26%** (B/.70,689), se ejecutaron novecientos tres balboas.

D - Maquinaria y Equipo:

Presupuesto Modificado y asignado 100 balboas.
Monto dirigido a la adquisición de diferentes equipos y maquinarias.

E - Transferencias Corrientes:

Presupuesto Modificado y asignado **B/.4,054,627.**

Recursos destinados a cumplir con la Ley de Cine, cuotas a organismos internacionales (UNESCO, IBERMEDIA, IFACCA, CACCI), acuerdo, convenios, indemnizaciones laborales, bonificaciones por antigüedad, capacitaciones, apoyo a instituciones sin fines de lucro y personas naturales que desarrollan el arte y la cultura a nivel nacional.

El compromiso y ejecución es del **74%** (B/.3,000,000).

IV - PRESUPUESTO DE INVERSIONES: Presupuesto Ley B/.19,845,700

A la fecha el presupuesto modificado es de B/.19,845,700; distribuidos así: el **74%** (B/.14,605,700.00) en Mantenimiento y Reparaciones de obras y el **26%** (B/. 5,240,000.00) para el proyecto Preservación del Patrimonio Material (Préstamo BID 4450/0C-PN. (Aporte Externo B/. 5,000,000.00 y Aporte Local B/. 240,000.00).

Al mes de febrero se asignó el **45%** (B/.8,902,777), el compromiso fue del **49%** (B/.4,334,433); la ejecución es del 3%.

Cuadro 5

Detalle	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN			% de EJECUCIÓN		
	Ley	Modificado	Asignado	Comprometido	Devengado	Pagado	Comprometido	Devengado	Pagado
	1	2	3	4	5	6	7=4/3*100	8=5/3*100	9=6/5*100
INVERSIÓN	**19,845,700**	**19,845,700**	**8,902,777**	**4,334,433**	**249,947**	**23,147**	**49**	**3**	**9**
Mantenimiento y Reparaciones de obras	14,605,700	14,605,700	4,120,478	2,222,233	249,947	23,147	54	6	9
Preservación del Patrimonio Material	5,240,000	5,240,000	4,782,299	2,112,200	-	-	44	0	0

Programa de Mantenimiento y Reparación de Obras:

El presupuesto Ley y Modificado es de B/.14,605,700; de esta suma se asignó **28%** el (B/.4,120,478) A la fecha el compromiso es del 54**% .**

A – Monumentos y Conjuntos Monumentales: Presupuesto Modificado B/.900,000.00.

Detalle de los proyectos:

1. **Patronato - Restauración del Fuerte y Castillo San Lorenzo:**
   Monto asignado B/.135,000.

2. **Patronato - Área Histórica de Panamá Viejo:**
   Monto asignado B/.189,000.

3. **Restauración de Inmuebles del Estado en el Casco Antiguo:**
   El presupuesto autorizado es de B/.400,000.

4. **Difusión de Bienes, Valores Patrimoniales y Culturales de Casco Antiguo:**
   El presupuesto autorizado es de B/.176,000

B – Centros Culturales: El Presupuesto Autorizado es de B/.12,023,613.00

Proyectos programados:

1. **Habilitación del Centro Cultural - Aguadulce**
   Presupuesto ley B/.366,713;

2. **Construc. Ciudad de Las Artes:** Presupúesto Ley B/.3,656,900;
   Asignado 53%, compromiso 56%. Este compromiso corresponde a la restructuración dinamica del presupuesto.

   Proyecto adjudicado a la Empresa Consorcio Omega en su inicio, para los "Estudios, diseños, Suministros de Materiales, Mano de Obra, Equipo, Administración y Construcción del Proyecto Ciudad de las Artes".

Contrato N°093-12	B/.54,527,345.00
Pago del anticipo	B/.10,905,469.00
Pago de la Cuenta de la 2 a la 12	B/.8,021,745.93
Saldo	**B/.35,600,130.07**

   A través de la Resolución N°071-18 J.D del 20 de junio de 2018, se autoriza el aumento de costo solicitado por **ASSA** dentro del acuerdo para la **Sustitución** de Contratista y la Adenda 2 al contrato 093-12, en virtud de la convención **SUNTRACS-CAPAC 2018**.

Saldo	**B/.35,600,130.07**
Resolución N°071-18 J.D del 20 de junio de 2018	B/.700.000.00
Total Adenda 2-2018	**B/.36,300,130.07**
Pagado en el 2018 – cuenta 1 y 2	B/.2,655,988.15
Pagado en el 2019 cuentas 3,4,5,6,7,8 y 9	B/.3,158,094.44
Pagado 2020 cuentas de la 10 a la 20	B/.8,766,744.32
Presupuesto 2021	B/.3,353,150.00
Saldo por pagar	**B/.18,366,153.16**

   Mediantecesión de contrato No. 001-2020 se suscribió formal cesión del contrato No. 093-12 del 6 de julio del 2012, a la Empresa Administradora de Proyectos de Construcción S.A. (APROCOSA).

   Este proyecto también contempla el contrato de Supervisón de la obra cuyo monto es de B/.1,350,000.00, a la fecha se han pagado B/.1,091,812.50.

3. **Restauración del Centro de Bellas Artes de Colón (Colegio Abel Bravo)**
   El monto aprobado es de B/.8,000,000.00

C – Centros de Educ. Artística: El Presupuesto Ley B/.473,577.

Este subprograma fomenta los valores culturales, cívicos y morales a través de los centros educativos y se contempla:

1. **Const. del Centro Superior de Bellas Artes y Folklore de Changuinola**
   El monto autorizado es de B/.250,000.

2. **Rehabilitación Centro Superior de Bellas Artes y Folklore de Santiago**
   El monto autorizado es de B/.33,577.

3. **Mejoramiento del Instituto Nacional de Música Narciso Garay**
   Monto autorizado es de B/.190,000.

D - Museos e Iglesias: Presupuesto ley es de B/.823,610.

Este subprograma contempla la restauración de los siguientes Museos:

1. **Habilitación de la Museográfica del Museo Reina Torres de Araúz (MARTA)** – contraparte prestamo BID- B/.552,330.

   Suma dirigida al pago de planilla y el servicio de gerencia del proyecto.

2. **Restauración del Museo de Historia y Arte Jose Domingo de Obaldia**
   Se le asignado la suma de B/.271,280.

E - Proyectos Regionales-Culturales: El Presupuesto ley es de B/.384,900.

Este subprograma contempla la inversión en Programas que estimulan el desarrollo de las artes, la cultura, la lectura y la música en la población del país:

1. **Difusión Temporada de verano**
   El Presupuesto ley es de B/121,900.

2. **Mejoramiento del Ballet Nacional**
   El Presupuesto ley es de B/.43,000.00

3. **Difusión del Núcleo Orquestal Infantil y Juvenil**
   El Presupuesto ley es de B/.173,000.00

4. **Equipamiento y Suministros del Ministerio de Cultura**
   El Presupuesto ley es de B/.47,000.00

Programa de Apoyo a la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural, Préstamo BID N°4450/OC-PN: Presupuesto Ley B/.5,240,000.00.

A. **Fortalecimiento Estratégico Institucional**
   El Presupuesto ley es de B/.385,713,00 modificado es de B/.385,713.00, se comprometió el 39%.

   Este subprograma contempla las siguientes Consultorías:

   1. **Servicios de Consultoría para el Diagnóstico del Clima Organizacional**: contrato No.CI-003-202, adjudicado a la Contratista Olga Margarita Murillo, está devengado por un monto de B/. 37,450.00. Contrato refrendado el 18 de diciembre de 2020. Consultoría culminada y pendiente de pago. Gestión de cobro en subsanación

2. **Servicios de Consultoría Individual para el Desarrollo e Implementación de un Programa de Fortalecimiento Institucional que incluye la Reingeniería Organizacional**: contrato No.CI-002-2020, adjudicado a la Contratista Lucia Natale, está comprometido por un monto de B/. 88,574.60. Contrato refrendado el 18 de diciembre de 2020; en la actualidad se entregó la orden de proceder para dar inicio de la consultoría el 15 de marzo de 2021.

3. **Servicios de Consultoría para la Elaboración de la Línea de Base de las Industrias Culturales y Creativas a Nivel Nacional**, el proyecto inició con el Contrato No.001-2020, consultor Cristóbal Muñoz por un monto de B/. 29,960.00 y fue culminada y pagó el 100%.

4. **Servicios de Consultoría para el Desarrollo de la Capacitación de Emprendedores de Industrias Culturales y Creativas y la Ejecución del Programa Piloto de Emprendimiento de Industrias Culturales y Creativas**: Contrato No. SBCC-002-2020, Adjudicado a Fundación Ciudad del Saber, por un monto de B/. 1,150,000.00 y se ha pagado 10,500. 00 y en trámite Devengado B/. 12,000.00 es decir 1.9 % de avance financiero. En la actualidad se encuentra en la fase de capacitaciones de los cuatro cursos en tres ediciones a través de la plataforma con una asistencia de un total de 1,200 participantes.

B. Manejo Teatro Nacional

El Presupuesto ley es de B/.126,650.00 y se encuentra en fase de elaboración del Plan de Manejo del Teatro Nacional. En el segundo trimestre se espera la contratación de dos especialistas para la ejecución del Plan de Manejo.

C. Restauración Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (MARTA)

El Presupuesto ley es de B/.1,860,721.00 ; Presupuesto Modificado B/.1,860,721.00

Proyectos de obras programados:

1. **Servicios de Almacenaje para el depósito de las piezas de la colección del Museo, Alquiler de depósito para piezas del Museo**: contrato No.001-2020, adjudicado al contratista Silvera, S.A., inició el 7 de septiembre de 2020 según orden de proceder, con una inversión de B/.239,837.04 de los cuales se ha ejecutado B/.39,972.84 es decir el 16% y está pendiente el recibido conforme parala entrega de la cuenta de enero y febrero de 2021.

2. **Restauración Integral del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, Construcción del Nuevo Edificio de Resguardo y Urbanización del Entorno**: contrato No.002-2020 por un monto de B/.14,710,283.78, adjudicado al Consorcio Cen Museo Marta, inició obras según orden de proceder el 7 de octubre de 2020, comprometido para la vigencia 2020 por B/.2,119,648.63 y ejecutado al 100%. Está en trámite la cuenta la cuenta 1 B/200,831.98 en la Contraloría, cuenta 2 B/ pendiente de firma del despacho superior y cuenta 3 pendiente de traslado de partida. El avance físico de la obra es un 5%. Esta obra se encuentra en fase de diseño.

D. Restauración de Fortificaciones del Conjunto Monumental de Portobelo y San Lorenzo

El Presupuesto ley es de B/.2,315,662.00.

Proyectos de obras programados:

1. **Restauración del Castillo de San Lorenzo:** Contrato No.001-2020, inició según orden de proceder el 11 de septiembre de 2020, adjudicado a la empresa Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A. con una inversión de B/.4,892,339.75, el cual se comprometió por B/.733,850.97 y se ejecutó B/.686,527.87, es decir el 94%. Actualmente el contratista está subsanando el formato de la cuenta por recomendación de la Contraloría. Esta obra tiene un avance físico de 11% y se encuentra en fase de estudios y diseños.

2. **Restauración de La Aduana de Portobelo, Distrito de Portobelo, Provincia de Colón:** Contrato No.LPN-001-2020 con una inversión de B/.3,794,220.00, adjudicado a la empresa Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. (APROCOSA), según orden de proceder inició obras el 5 de octubre de 2020, el

cual se comprometió para la vigencia 2020 por B/.379,422.00, se ejecutó y fue pagado al 100%. Actualmente la empresa entregó cuenta y pendiente de firma de parte de la arquitecta designada por la Contraloría. Esta obra tiene un avance físico del 5%

Contrato No.LPN-001-2020	B/.3,794,220.00
Pago del anticipo 10%	B/. 379,422.00
Saldo por pagar	**B/.3, 414,798.00**

E. Administración del Programa Conservación y Patrimonio

Para la vigencia fiscal 2021, el Presupuesto ley es de B/.551,254.00, el modificado es de B/.551,254.

1. **Servicios Selección de Consultores (Ente de Gestión) para brindar al INAC Servicios de Apoyo Especializado para la Gestión del Proyecto PN-L1146:** contrato No.004-208 por un monto de B/.3,476,755.13 que fue adjudicado a la empresa McLatam, S.A. el cual fue comprometido para la vigencia fiscal 2020 por B/.1,080,477.00 y con una ejecución de B/.199,989.17 es decir el 19%. Se remitió consulta a la Dirección General de Ingresos a fin de aclarar formato de presentación de factura y deducción de impuesto para la presentación de la cuenta 2021

ANEXOS
